

특수공시

2019회계연도 지방재정 특수공시 작성 대상

연번	사업명	담당부서	전화번호	비고
1	세계 승강기 허브도시 조성사업	미래전략과	055-940-3702	
2	U-도서관 서비스 설치	인구교육과	055-940-8472	
3	서출동류 물길 트레킹 코스 개발	문화관광과	055-940-3442	
4	빼재 산림레포츠파크 조성	산림과	055-940-8893	
5	거창 향노화 힐링랜드 조성	산림과	055-940-8892	
6	거창 하천환경교육센터 조성사업	환경과	055-940-3512	
7	수월지구 대구획 경지정리사업	건설과	055-940-3542	
8	거창위천 고향의 강 조성사업	건설과	055-940-3642	
9	한들교 가설공사	도시건축과	055-940-3592	
10	대평리 우회도로 개설사업	도시건축과	055-940-3592	
11	거창사과 융복합산업지구 조성	행복농촌과	055-940-8153	
12	노후 상수도 관망 현대화 사업	수도사업소	055-940-8426	

1

세계승강기 허브도시 조성사업

사업목적

- ◆ 승강기 제조 글로벌 기업이 주도하여 중소기업과 동반성장하는 앵커기업 주도형 산업클러스터 조성
- ◆ 일자리 창출, 지역균형 발전, 승강기 안전관리 강화 등 정부정책에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 남상면 대산리 일원, 합천군 용주면 고품리 일원
- 사업기간 : 2019. 6. ~ 2021. 12. (2년 7개월)
- 사업량 : 18,144m², 복합관·기숙사 5,534m²
- 사업비 : 231억원(국86, 도28.5, 군96.5, 공단 20) * 총사업비 241억원

(단위 : 억원)

구 분	합 계		2019년		2020년		2021년	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		231		58.6		77.5		94.9
국 비	복합관,기숙사 건조비 교역비 구입비 장비 구입비 장비 구입비	86	복합관,기숙사 설계용역 구입비 장비 구입비 장비 구입비	24.8	복합관,기숙사 공사비 구입비 장비 구입비 장비 구입비	24.8	복합관,기숙사 건조비 교역비 구입비 장비 구입비 장비 구입비	36.4
도 비		28.5		8.25		8.25		12
군 비		96.5		25.55		44.45		26.5
민 자		20		-		-		20

- 사업내용 : 승강기 산업클러스터 조성, 승강기엔지니어 양성사업

□ 추진상황

- 2019. 4. 8. : 2019 지역발전투자협약 시범사업 공모 선정
- 2019. 6. 27. : 지역발전 투자협약 시범사업 업무협약(행안부⇔도⇔거창·합천)
- 2019. 7. 16. : 세계승강기 허브도시 조성사업 업무협약(거창군⇔공단)
- 2019. 9. 23. : 승강기공단 추진위원회 사무국 구성(6명)
- 2020. 4. 6. : 승강기산업 복합관·기숙사 설계용역 업체 선정 및 착수

□ 향후추진계획

- 2020. 10. : 승강기산업 복합관·기숙사 설계용역 준공
- 2021. 12. : 승강기산업 복합관·기숙사 준공
- 2021. 1. : 거창 승강기인재교육원 운영

□ 거창승강기밸리 전경(사업 대상지)



□ 사업계획도



2

U - 도서관 서비스 설치

사업목적

언제 어디서든 24시간 도서 대출 · 반납 서비스를 제공 받을 수 있는 U-도서관 서비스 설치

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4월 ~ 12
- 구축장소 : 2개소
(스포츠파크 스마트도서관, 승강기안전기술원 스마트도서관)
- 사업내용 : U - 도서관 (24시간 무인대출반납서비스 시스템) 2식
- 사 업 비 : 240백만원 (국 120, 군 120)

□ 추진상황

- 2018. 10. : 2019년 U-도서관 서비스 구축 사업(국비 120백원 확보)
- 2019. 5. ~ 6. : U-도서관 설치장소 기관 협의
- 2019. 7. ~ 8. : 스포츠파크 U-도서관 설치 및 시범 운영
- 2019. 9. ~ 10. : 승강기안전기술원 U-도서관 설치
- 2019. 11. : 승강기안전기술원 U-도서관 시범 운영
- 2019. 12. : 승강기안전기술원 운영

□ 향후추진계획

- 2021년 U-도서관 확대 구축 검토 중

□ 기대효과

- 생활권과 가까운 곳에 도서관 조성으로 국민의 독서 여건 마련 및 지역·계층 간 정보 격차 해소

□ 관련사진



3

서출동류 물길 트레킹코스 개발사업

사업목적

트레킹코스 개설을 통한 걷기 힐링으로 관광객유치 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 북상면 월성리 ~ 창선리 일원
- 사업기간 : 2018. 5. ~ 2019. 11.
- 사업내용 : 트레킹코스 개설 L=2.88km, 안내표지판 설치 등
- 시 행 자 : 거창군 문화관광과
- 사 업 비 : 1,020백만원(군특 450, 도135, 군435)

(단위 : 천원)

구 분	총 액	년도별 사업비			
		기투자	2016년	2017년	2018년
계	1,020	0	20	100	900
국 비	450	-	-	-	450
도 비	135		-	-	135
군 비	435		20	100	315

□ 추진상황

- 2016. 6. : 기본계획용역 완료
- 2017. 12. : 주민설명회 및 실시계획용역 완료
- 2018. 5. : 공사 착공
- 2018. 10. : 도유지 협의완료
- 2019. 3. : 군립공원 구역 행위허가 완료
- 2019. 4. : 산지전용 허가 완료
- 2019. 9. : 하천점용 허가 완료
- 2019. 11. : 공사 준공

□ 기대효과

- 트레킹코스 개설로 지역경제 활 성화 및 관광객 증가 기대

□ 위치도



4

배재 산림레포츠파크 조성

사업목적

백두대간 권역의 수려한 자연경관과 용도 폐지된 국도37호선을 활용하여 백두대간권 생태복원 및 덕유산권 핵심 산악 관광레저타운 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 고제면 개명리 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 백두대간 생태교육장 : 생태교육장, 게스트하우스, 야외무대 등
 - 스피드 익스트림타운 : 마운틴코스터, 상하부 승강장 등
 - 향노화 휴양체험지구 : 산림휴양관(10실), 오토 캠핑장, 약초단지 등
 - 진입도로 개설 : 도로개설 L=602.0m, B=10~12m
 - 배재 레저모험타운 : 고공전망타워 1식, 산림레포츠시설
- 사 업 비 : 41,350백만원(국비 22,800 도비 5,520 군비 13,030)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	년도별 투자계획						
		기투자	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	41,350	19,750	5,620	4,951	8,829	2,200	0	0
생태교육장	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-
스피드 익스트림	11,700	8120	720	3,600	3,580	-	-	-
휴양체험지구	10,050	5,700	4,200	150	-	-	-	-
진입도로	4,000	250	700	801	2,249	-	-	-
레저모험타운	5,600	-	-	400	3,000	2,200	-	-

□ 추진상황

- 백두대간 생태교육장 조성사업 : 10,000백만원
 - 2014. 6월 : 공사착공(토목, 조경, 건축, 전기, 폐기물, 통신 등)
 - 2016. 10월 : 건축공사 및 전시시설 등 준공
 - 2017. 1월 : 백두대간 생태교육장 개관식 개최
 - 2017. 4월 : 백두대간 생태교육장 게스트하우스 운영

- 스피드 익스트림타운 조성사업 : 11,700백만원
 - 2014. 12월 : 기본 및 실시설계용역 착수
 - 2017. 08월 : 군계획시설(주차장, 도로, 궤도) 결정
 - 2017. 03월 : 기본 및 실시설계용역 완료
 - 2017. 12월 : 스피드익스트림타운 기반조성공사 착공
(토목·건축·전기·통신)
 - 2018. 11월 : 마운틴코스터 제작설치 계약심의위원회 심의
 - 2019. 05월 : 마운틴코스터 제작설치 발주
 - 2019. 08월 : 마운틴코스터 제안공모 공고
 - 2019. 12월 : 마운틴코스터 제작·설치 계약체결
- 향노화 휴양체험지구 조성사업 : 10,050백만원
 - 2016. 6월 : 백두대간 거창 자연휴양림 지정·고시
 - 2016. 12월 : 향노화 휴양체험지구 기본 및 실시설계용역 착수
 - 2018. 5월 : 향노화 휴양체험지구 조성공사(1단계) 완료
 - 2018. 11월 : 백두대간 거창 자연휴양림 조성계획 승인
 - 2018. 11월 : 향노화 휴양체험지구 조성공사(2단계) 계약
 - 2019. 1월 : 업무이관(농업기술센터⇒산림과)
 - 2019. 05월 : 공사 착공
- 빼재산림레포츠파크 진입도로 조성사업 : 4,000백만원
 - 2017. 10월 : 지역개발계획 사업대상지 확정
 - 2018. 5월 : 실시설계용역 착수(도시건축과)
 - 2018. 8월 : 업무이관(도시건축과 ⇒ 산림과)
 - 2019. 3월 : 실시설계용역 완료
 - 2019. 12월 : 보상완료 29필지, 미협의 3필지(협의율 90%)
 - 2019. 12월 : 공사 착공
- 빼재레저모험타운 조성사업 : 5,600백만원
 - 2019. 3월 : 투자심사 완료
 - 2019. 10월 : 균특(지방이양) 예산확보
 - 2020. 04월 : 기본설계용역 착수


□ 향후추진계획

- 스피드 익스트림타운 조성사업
 - 2020. 1 ~ 6월 : 출·도착시스템, 전기제어시스템, 코스터설치
 - 2021. 7 ~ 8월 : 시험운영 및 준공
- 향노화휴양체험지구 조성사업
 - 2020. 12월 : 향노화 휴양체험지구 조성공사 준공
- 빼재산림레포츠파크 진입도로 개설사업
 - 2021. 6월 : 휴양체험지구 연결 구간 완료
 - 2022. 12월 : 공사 준공
- 빼재레저모험타운 조성사업
 - 2020. 10월 : 기본설계용역완료
 - 2020. 11월 : 제안공모 실시
 - 2020. 12월 : 인허가 추진(자연휴양림 조성계획(변경))
 - 2022. 12월 : 공사 준공

□ 기대효과

- 남녀노소 즐길 수 있는 레포츠 및 캠핑장 조성으로 가족단위 관광객 유치 기여
- 향노화 힐링랜드, 창포원 등과 연계한 관광도시로서의 명품거창 이미지 제고

□ 조 감 도

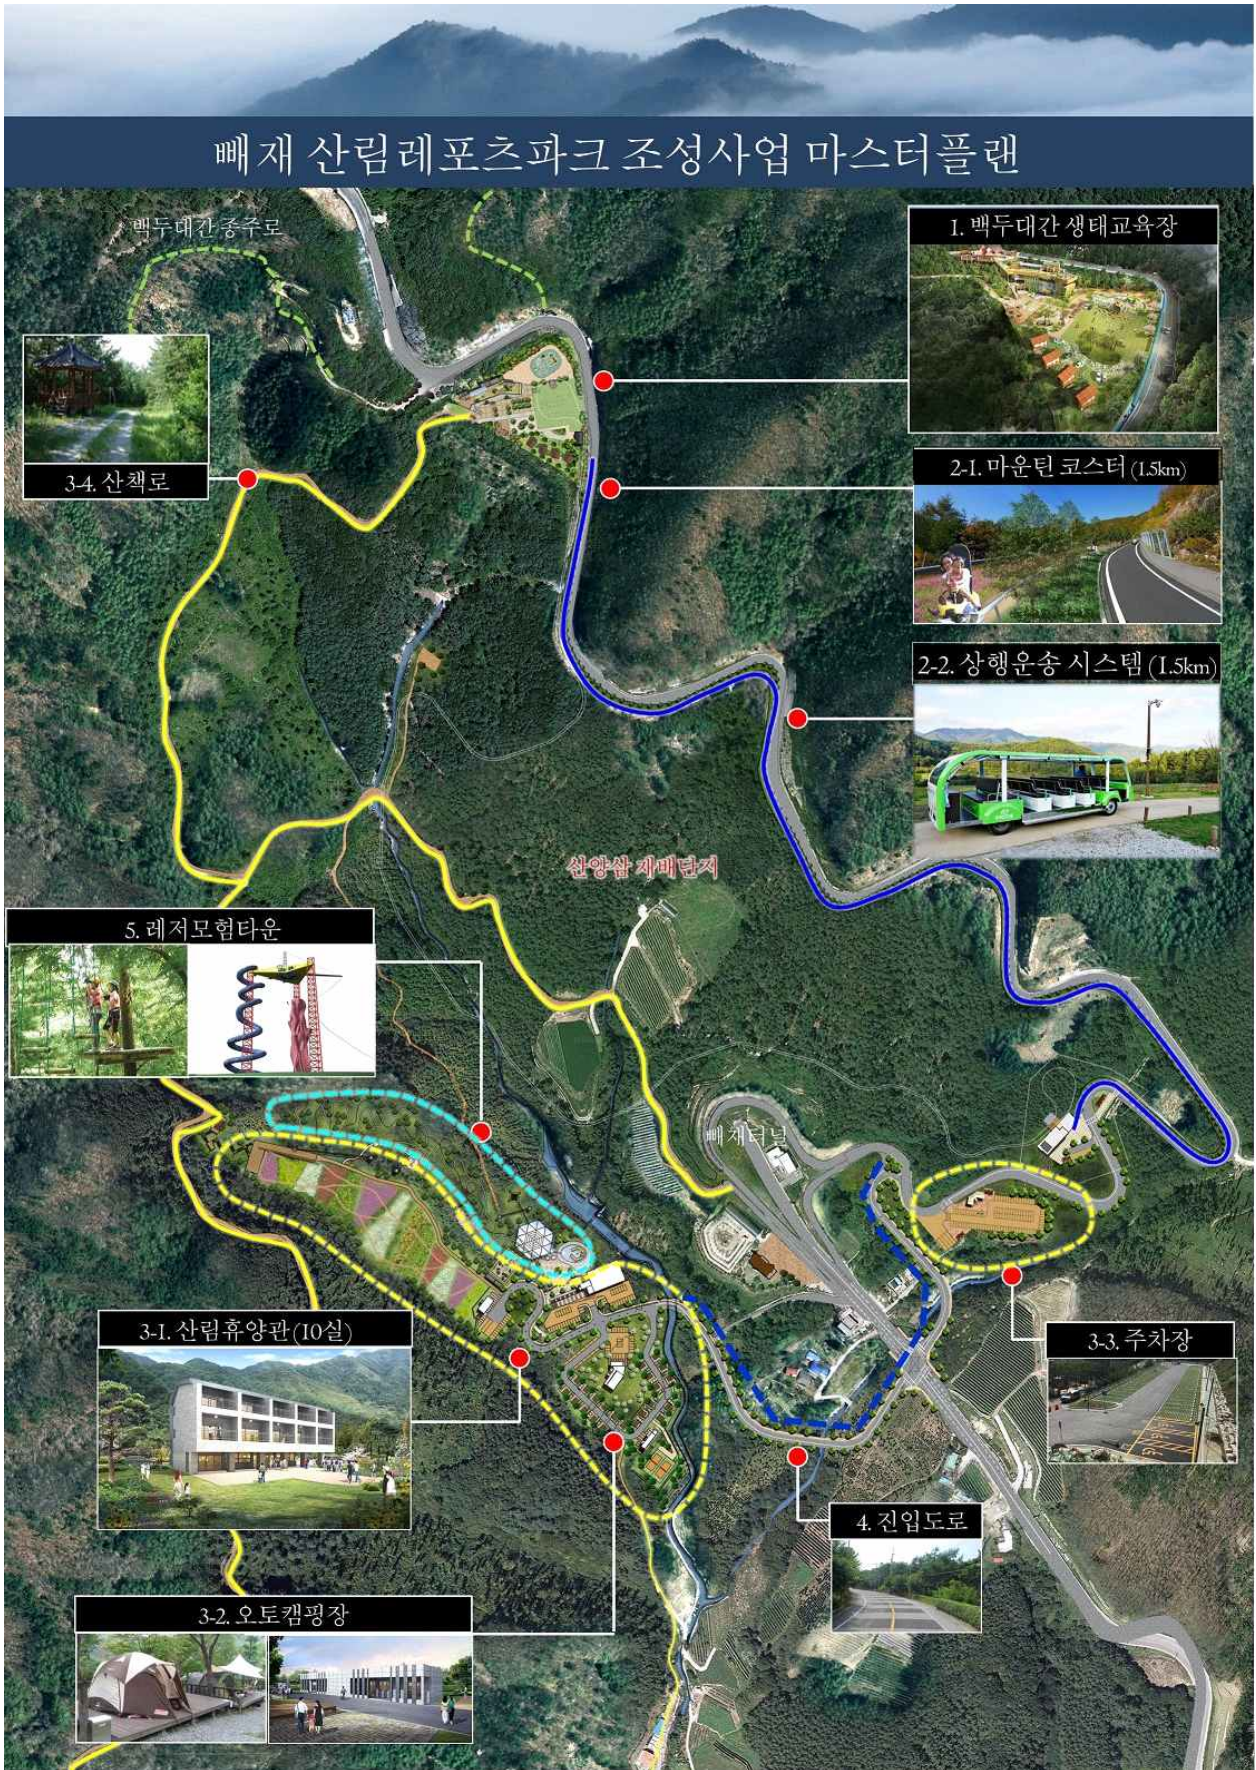

5

거창 향노화힐링랜드 조성

사업목적

지역의 풍부한 산림자원을 활용, 차별화된 산림관광자원을 확충함으로써 급증하는 산림휴양 수요를 흡수하면서 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 가조면 수월리 산19번지 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2022년
- 사업규모 : 979,276m²
- 사업내용
 - 거창 치유의숲 : 산림치유센터(851m²), 무장애데크로드 1.3km, 숲체험장, 숲속도서관, 명상숲길 조성
 - 거창 향노화 자연휴양림 : 산림휴양관(1동/10실), 숲속의집(8동), 관리사무소 1동
 - 거창 향노화 자생식물원 : 자생수목원, 무장애탐방로, 암석원, 휴게쉼터 등
 - 거창“Y”자형 출렁다리 : 출렁다리 109m, 잔도 18m 등
 - 힐링랜드 등산로 주차장 : 주차장 정비(A=4,853m², 129면)
 - 힐링랜드 등산로 정비 : 등산로정비 1.1km, 전망대 및 쉼터 10개소
 - 힐링랜드 진입로 정비 : 데크로드 조성 L=847m
- 사 업 비 : 26,150백만원(국 10,740 도 3,550 군 11,860)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	년도별 투자계획						
		기투자	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	26,150	12,650	4,810	4,850	1,200	2,640	0	0
치유의숲 (보완사업 포함)	6,310	5,200	810	300	-	-	-	-
자연휴양림	5,300	2,300	1,500	1,500	-	-	-	-
“Y”형 출렁다리	2,800	2,200	600	-	-	-	-	-
등산로주차장	1,800	1,800	-	-	-	-	-	-
자생식물원	1,500	100	700	700	-	-	-	-
등산로 조성	1,600	50	1200	350	-	-	-	-
오수관로 정비 등	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-
진입로 확장	4,240	0	0	2,000	400	1,840	-	-
휴양림 보완 등	1,600	-	-	-	800	800	-	-

□ 추진상황

- 치유의 숲 조성[산림치유센터 1동 851m², 무장애길, 숲체험장 등]
 - 공사착공 : '16. 3. 준공 : '19. 10.
 - 숲체험장 등 보완사업 착공 : '19. 5.
- 자연휴양림[산림휴양관 1동/10실, 숲속의집 8동, 관리사무소 1동]
 - 자연휴양림 조성계획 승인: '17. 8, 건축협의를: '18. 2
 - 착공 : '18. 5.
- “Y”형 출렁다리[출렁다리 109m, 잔도, 전망데크 등]
 - 실시설계 착수 : '17. 2. / 특허공법 선정 : '17. 9.
 - 착공 : '18. 6. / 준공 : '19. 9
- 자생식물원 조성[자생수목원, 수국원, 탐방로, 암석원 등]
 - 실시설계 완료 : '18. 12. / 착공 : '19. 9.
- 등산로 조성사업[등산로 개설 800m, 등산로 정비 500m, 쉼터 등]
 - 실시설계 완료 : '19. 5. / 착공 : '19. 9. / 준공 : '20. 5.
- 진입로 확장[데크로드(보행로) 847m 진입로확포장 850m,]
 - 데크로드 공사 착공 : '19. 12. / 준공 : '20. 6.
 - 진입로 확포장 : 21년 예산 신청(4억원)

□ 향후추진계획

- 2020. 12월 : 거창 치유의숲 숲체험장 등 보완사업 준공
- 2020. 12월 : 거창 향노화 자생식물원 조성사업 준공
- 2021. 5월 : 거창 향노화 자연휴양림 조성사업 준공

□ 기대효과

- 국내유일의 “Y”형 출렁다리 조성으로 지역 관광산업 활성화
- 가조온천과 이어지는 치유를 위한 힐링관광의 인프라 구축
- 관광객 유치로 지역경제 활성화 기여 및 거창의 브랜드파워 향상

□ 조 감 도



거창 향노화 힐링랜드

The map shows a central river valley with surrounding hills. A yellow line indicates a main path, and a blue line shows the river. Red dots mark key locations, each linked to a photo of a specific feature.

자연휴양림	치유의숲
<p>Y자형 출렁다리</p>	<p>마장재길</p>
<p>잔도</p>	<p>늘해랑누리길</p>
<p>출렁다리길</p>	<p>산림치유센터</p>
<p>숲속의집</p>	<p>숲체험장</p>
<p>산림휴양관</p>	<p>관리사무소</p>
<p>자생식물원</p>	<p>주차장</p>

6

거창 하천환경교육센터 조성사업

사업목적

환경체험 교육장으로써의 역할과 지역주민의 소득증대 및 일자리 창출

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 거창읍 가지리 188-1번지 일원
- 사업기간 : 2017년 ~ 2020년
- 사업면적 : 3층건물 1동(499.29m²), 유리온실(297m²)
- 사업내용 : 환경교육센터 및 농·특산물 판매장, 편의시설 설치 등
- 사업시행 : 거창군(환경과)
- 사 업 비 : 2,200백만원(낙동강수계기금)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	년도별 투자현황		
		2017년	2018년	2019년
계	2,200	700	700	800
기 금	2,200	700	700	800

□ 추진상황

- 2016. 9. : 공모사업 신청 **【국농소마을회(강과사람)→군→낙동강청】**
- 2016. 12. : 특별지원사업 공모사업 선정(낙동강유역환경청)
- 2017. 11. : 공유재산관리계획 의회 승인
- 2017. 12. : 토지보상 완료 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 5. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2018. 11. : 건축공사 착공


□ 향후추진계획

- 2020. 8. : 공사 준공 및 등기
- 2020. 9. : 위탁관리 협약 체결
- 2020. 10. : 거창 하천환경교육센터 운영 개시

□ 기대효과

- 환경교육 체험으로 인한 주민인식 제고 및 일자리 창출로 지역경제 활성화

□ 위치도

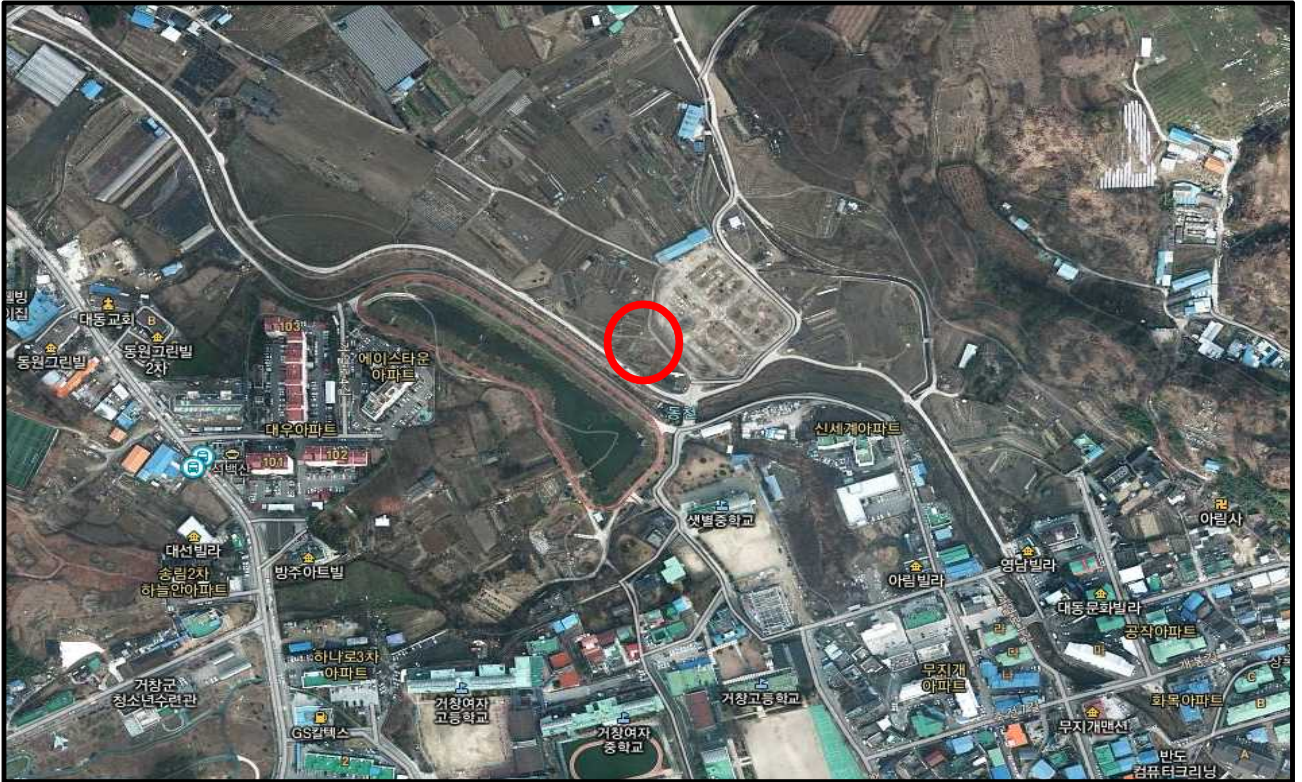

□ 전경 사진



7

수월지구 대구획 경지정리사업

사업목적

경지정리된 우량농지 구간 용·배수로 등 취약한 기반시설의 재정비를 통한 농업생산성 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 가조면 수월리 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(3년간)
- 사업량 : 수혜면적 80.4ha / 용배수로 정비 1식
- 사업비 : 2,100백만원(균특전환 80%, 도 6%, 군 14%)

(단위 : 천원)

구분	총액	년도별 투자계획			
		기투자	2019년	2020년	2021년
계	2,100,000	-	150,000	1,150,000	800,000
균특전환	1,680,000	-	120,000	920,000	640,000
도비	126,000	-	9,000	69,000	48,000
군비	294,000	-	21,000	161,000	122,000

□ 추진상황

- 2019. 2. ~ 8. : 실시설계용역 및 주민설명회 개최
- 2019. 12. : 수월지구 대구획 경지정리사업 시행계획 승인(경상남도)
- 2020. 2. : 수월지구 대구획 경지정리사업 사업비교부(거창군⇒한국농어촌공사)
- 2020. 2. : 사업착공


□ 향후추진계획

- 2021. 12. : 사업준공

□ 기대효과

- 노후 및 파손, 시설기준 미달 등 영농불편을 초래하는 취약한 농업 생산기반시설 재정비를 통한 영농불편 해소 및 농가소득 증대 기여

□ 위치도

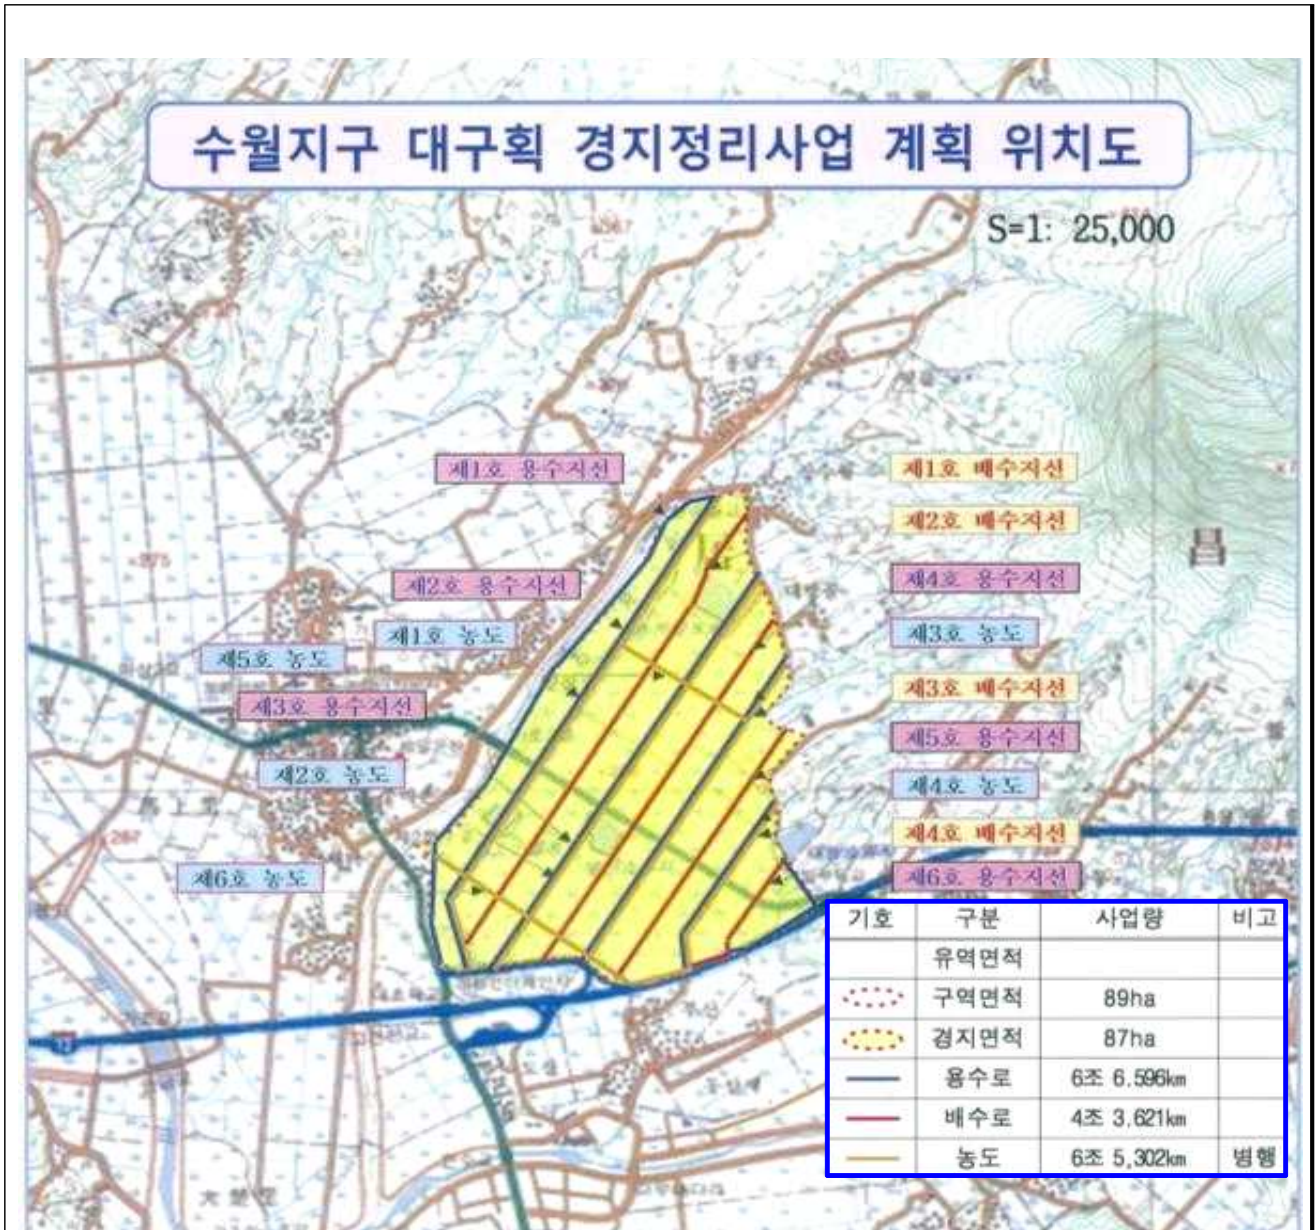

기존 용수로 시설 노후 및 파손



농로 폭 협소에 따른 통행불편

8

거창 위천 고향의 강 조성사업

사업목적

- 사람 자연 생태계가 조화되는 아름다운 하천조성
- 아름다운 자연경관과 조화되는 수변 공간 조성

사업개요

- 위 치 : 거창군 마리면 하고리 ~ 위천면 강천리
- 사업기간 : 2015년 ~ 2021년
- 사업량 : 하천정비 L=9.88km
 - 보축 4.29km, 보 개량(어도)7개소, 자전거도로 12km
 - 보도교 1개소, 친수·생태공간조성 5개소, 교량 1개소 등
- 사업비 : 25,741백만원(국비 15,145, 도비 3,028, 군비 7,568)

구분	총사업비	년도별 투자계획			
		2018년 이전	2019년	2019년 이후	비고
계	25,741	19,907	5,834	-	
국비(60%)	15,145	11,579	3,566	-	
도비(12%)	3,028	2,316	712	-	
군비(28%)	7,568	6,012	1,556	-	

추진상황

- 2013. 1. : 실시설계용역 착수(경제성, 문화재 지표, 지질조사, 소규모환경)
- 2015. 1. : 총사업비 협의 완료(23,535백만원 ⇒ 25,241백만원)
- 2015. 5. : 공사 착공
- 2018. 12. : 총사업비 협의 완료(계동교 등 재가설, 500백만원 증)
- 2019. 1. : 계동교 등 재가설 실시설계용역 착수
- 2020. 1. : 계동교 등 재가설 착수


향후추진계획

- 2020. 10. : 고향의 강 조성사업 본 공사 완료
- 2021. 12. : 계동교 등 재가설공사 완료

기대효과

- 아름다운 자연경관 조성과 친숙하고 편안한 하천조성으로 더 큰 거창 도약을 기반조성

□ 위치도

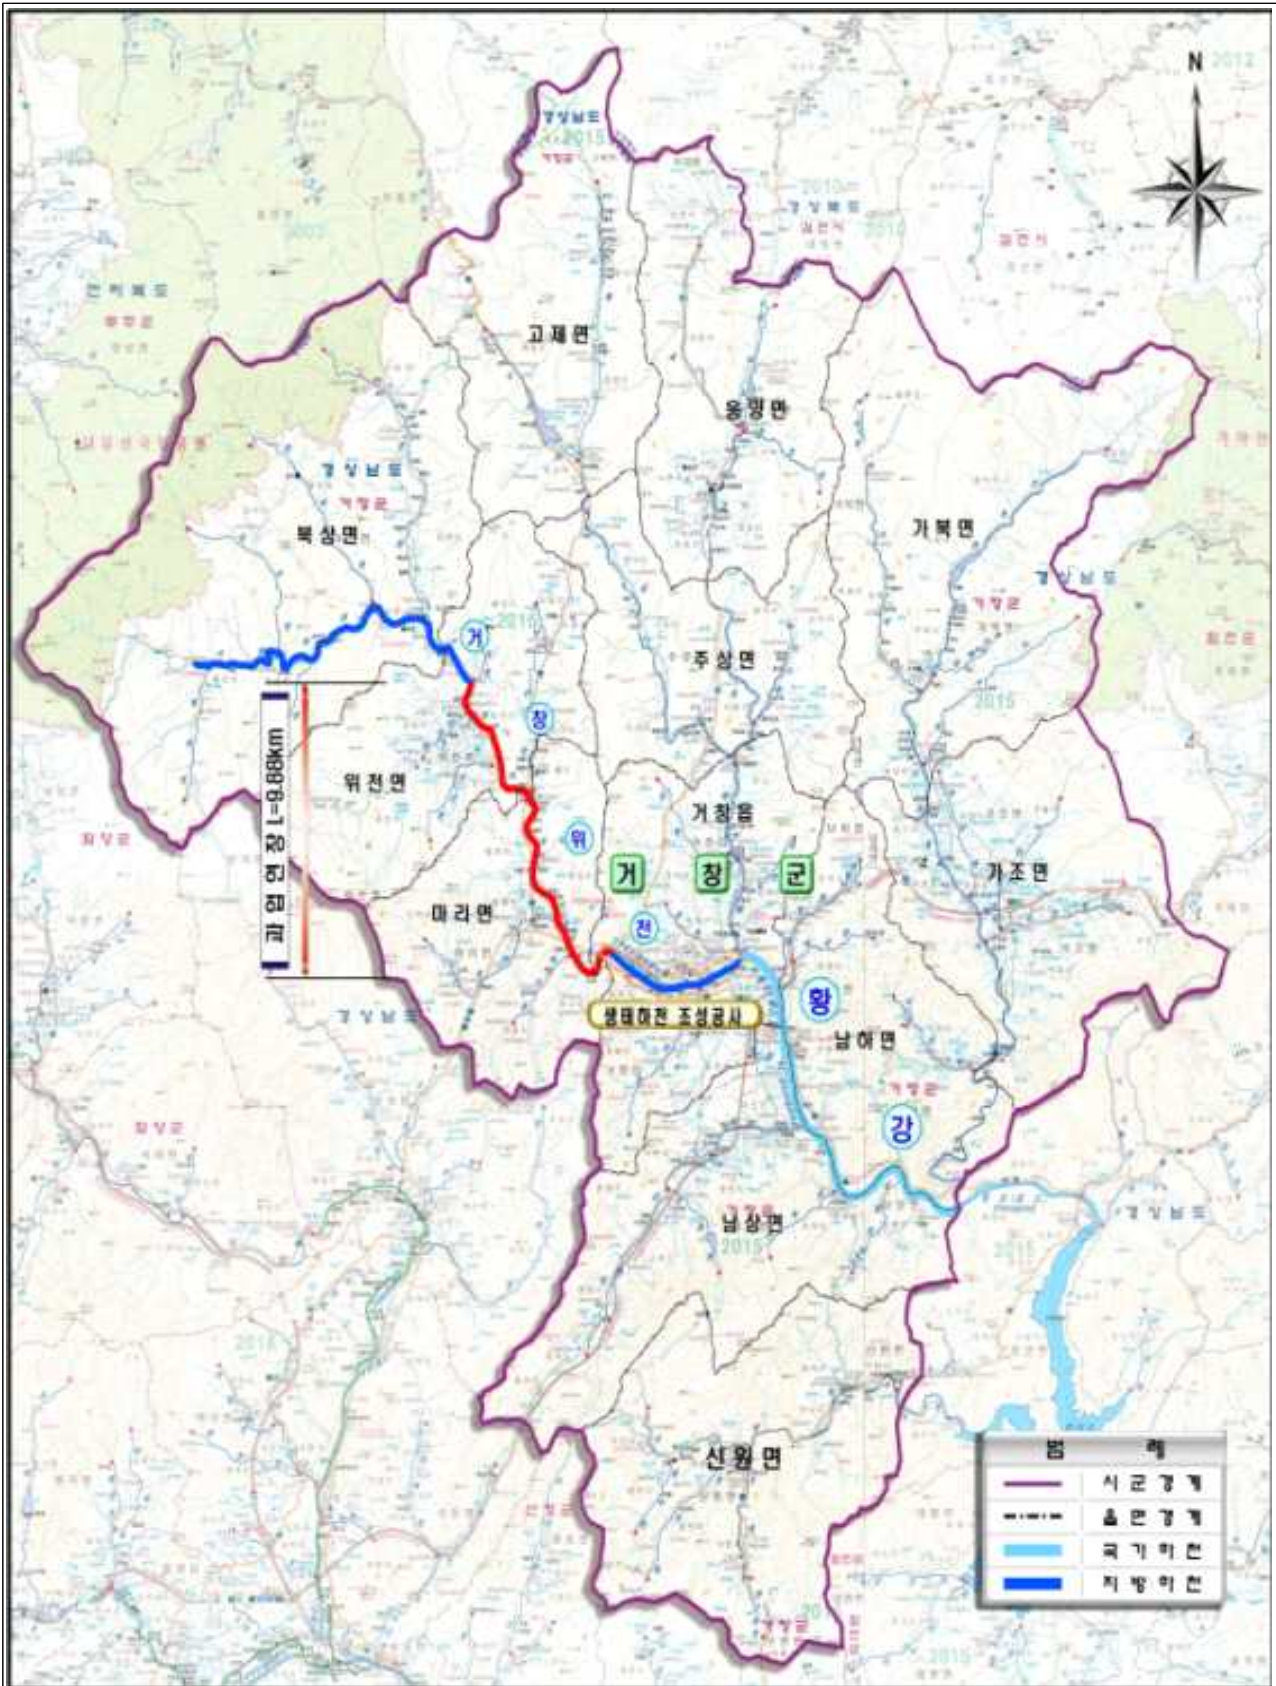

9

한들교 가설공사

사업목적

거창읍 대평리 코아루 아파트 ~ 대동리 ~ 거창 스포츠파크를 연결하는 교량가설로 시가지 교통체증 및 강남·북 균형발전 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 거창읍 대동리 ~ 대평리 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 조성면적 : 교량가설 L=194m, B=20m
- 개발방법 : 공영개발(거창군수)
- 사 업 비 : 15,000백만원

구 분	총 액	년도별 투자계획						
		기투자	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	15,000	2,500	5,200	7,300	0	0	0	0
국 비	4,000	2,000	2,000					
특 · 교	700		700					
도 비	5,000		1,000	4,000				
군 비	5,300	500	1,500	3,300				

□ 추진상황

- 1992. 12. : 군계획시설 결정(교통시설 : 중로 1-16호선)
- 2014. 6. : 실시설계 완료
- 2018. 2. : 공사 착공

□ 향후추진계획

- 2020. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

- 시가지 교통체증 및 강남·북 균형발전 도모

□ 위치도



10 대평리 우회도로 개설사업

사업목적

거창읍 대평리 대단지 아파트 조성 및 신설교량(한들교) 설치로 예상되는 교통량 분산 및 주민불편통행 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 거창읍 대평리 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 조성면적 : 도로개설 L=1.18km, B=20m
- 개발방법 : 공영개발(거창군수)
- 사 업 비 : 9,000백만원

구 분	총 액	년도별 투자계획						
		기투자	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	9,000	5,000	1,200	1,500	1,300	0	0	0
특·교	5,500	5,000	500					
도 비	350		350					
군 비	3,150		350	1,500	1,300			

□ 추진상황

- 2017. 12. : 군계획시설 결정(교통시설 : 중로 1-54호선)
- 2019. 3. : 실시설계 완료
- 2019. 4. : 보상협의 시행
- 2020. 2. : 공사 착공

□ 향후추진계획

- 2022. 2. : 공사 준공

□ 기대효과

- 대단지 아파트 및 교량 개설 등으로 인한 주변 교통환경 변화에 맞춘 도로개설로 도시기반 시설 확충 및 지역개발 촉진

□ 위치도



11 거창 농촌융복합지구 조성사업

사업목적

사과 푸드코트 조성하고 다양한 체험거리와 창업 지원을 통해 거창 사과 브랜드의 위상을 높이고 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 거창읍 거함대로 3372 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 3,000백만원

구 분	총 액 (백만원)	년도별 투자계획			
		2019년	2020년	2021년	2022년
계	3,000	400	800	1,200	600
국 비	3,000	400	800	1200	600

□ 사업내용

2020년 사업비 구 분		사 업 내 용	사업비 (백만원)	비고
계			800	
농촌융복합산업 공동인프라구성	거창사과융복합공간조성	• 푸드종합센터 확장 & 푸드코트조성	600	'20~ '21
네트워킹 및 주체 역량강화	융복합사업단 운영	• 사무국 운영 • 테마기획 컨설팅	33 22	
고부가가치화 및 지역브랜드화	홍보 및 마케팅 추진	• 사과 디저트 행사 • 스포츠마케팅 • 사과체험·투어 프로그램 • 공공급식 공급확대 프로모션 • 식품박람회 참가	20 20 27 20 5	
	거창사과 상품화 지원	• 농산물기공지원센터 R&D 용역 • 포장재 제작 • 디저트 메뉴 개발 교육	20 23 10	

□ 추진상황

- 2019. 11. : 오늘자람(사과즙) 학교급식 및 공공급식 공급 확대,프로모션 실시(1,829개소 / 40백만원)
- 2019. 11. : 소비자 시장조사 시행
- 2019. 11. : 미래소비자 사과투어프로그램 운영(2기 245명)
- 2019. 12. 사과디저트 교육 프로그램 운영(10회 25명 수료)
- 2019. 11. 20. ~ 11. 23. : 거창사과가공품 식품박람회 참석(3일)
- 2020. 1. 20. : 거창군 - 대구한의대학교 MOU 체결
- 2020. 2. ~ 11. : 거창사과 스포츠 마케팅 시행(NC창원마산구장 / 44백만원)
- 2020. 3. : 가공품 포장 디자인 완료(퓨레, 사과주스, 사과꿀빵)
- 2020. 3. : 농촌융복합지구 테마기획 용역 시행
- 2020. 3. : 거창사과 통합마케팅 수립 용역 시행
- 2020. 4. : 가공센터 R&D 용역 시행(꽃사과, 쿠키, 스틱)
- 2020. 2. ~ 6. : 거창사과 푸트코트 F&B 컨설팅 협의(1~3차)
- 2020. 7. : 거창사과 푸드코트 F&B 컨설팅 용역 실시

□ 향후추진계획

- 2020. 10월 : 경상남도 계약심사 및 실시설계 용역 실시
- 2020. 12. ~ 2021. 12. : 착공 및 준공
- 2021. 4월 : 거창사과 푸드코트 인테리어 컨설팅 시행
- 2022. 1. ~ 6. : 거창사과 푸드코트 장비·시설 구입

□ 기대효과


- 농촌융복합지구 조성으로 지역경제의 활력을 제고하며 거창사과 브랜드 가치의 격상시킴

□ 위치도




□ 조감도

사과&푸드코트
시설 계획
(2층/750m²/철골구조)



대상지 현황

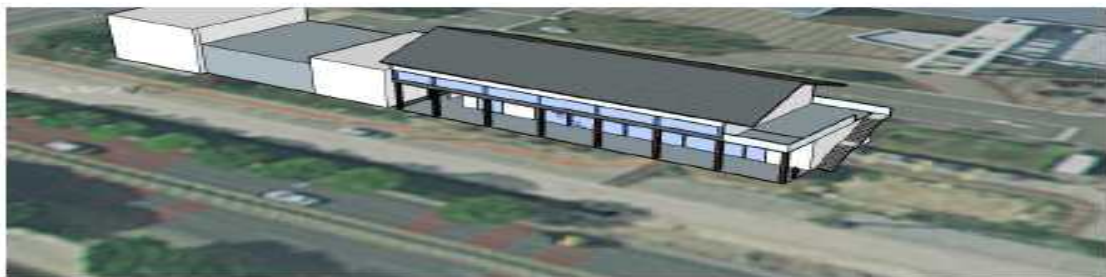

사과&푸드코트 조성 전경

12 거창군 노후 상수관망 현대화 사업

사업목적

노후 상수관망 정비를 통해 안전한 수돗물을 공급과 유수율 제고를 통한 경영 개선

□ 사업개요

- 사업위치 : 거창읍 강남지역, 가조면 지역
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2023. 12.
- 주요 사업내용
 - 노후관로 교체 L=96.1km, 블록 구축 18개소
 - 블록 유량계측 1식, 유지관리시스템 1식 등
- 사업비 : 20,778백만원(균특 10,700, 균비 10,078)

(단위:백만원)

구분	총사업비	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	비고
계	20,778	4,359	3,117	5,740	5,843	1,719	
균특	11,136	2,615	1,870	2,870	2,921	860	
균비	9,642	1,744	1,247	2,870	2,922	859	

□ 추진상황

- 2019. 4. 22. ~ 2020. 4. 20. : 가조급수구역 누수탐사 및 복구 공사 시행, 누수탐사 24건/ 누수복구 24건
- 2019. 5. 29. ~ 2021. 5. 28. : 블록구축 및 관망정비 기본 및 실시설계용역 시행 (공정율 40%)
- 2019. 6. : 강남 급수구역 사업대상지 확정을 위한 강남유량계 설치
- 2020. 2. ~ 4. : 도상블록 분할 및 블록고립 확인 15개소
- 2019. 10. ~ 12. : 가조 급수구역 관망운영관리 구축(소규모 수압 감시체계 구축 9개소)

□ 향후추진계획

- 2020. 6. : 남상배수지 유입유량계, 가조배수지 유출유량계 설치 및 고립실패 블록 재확인
- 2020. 8. : 환경부 사전기술 검토협의 ⇒ 강남 급수구역 사업 대상지 확정여부 결정
- 2020. 10. : 거창군 블록시스템 구축공사 발주
- 2021. 6. : 노후관 정비공사 발주
- 2023. 12. : 목표 유수율(85%) 달성 성과관정, 환경부 승인

□ 기대효과

- 노후관 정비를 통해 유수율 제고 및 깨끗한 수돗물 안정적 공급

□ 사업대상지

