공약번호	1-2-1
이 행 율	30%

추진담당	산림휴양담당
추진상황	정상추진

거창 앙노와 일링랜드 쪼성

◇ 지역의 풍부한 산림자원과 특색있는 온천자원을 활용한 치유의 숲, 자연휴양림 등 치유단지를 조성하여 산림휴양 및 산림복지 서비스 수준 제고

□ 사업개요

O 사업기간: 2014년 ~ 2020년

O 위 치: 거창군 가조면 수월리 산19번지 일원(979,276m²)

O 사 업 량

- 치유의 숲 : 산림치유센터, 아트포레스트, 약용수원, 치유숲길 등

- 자연휴양림: 산림휴양관, 숲속의집, 숲속교실, 에코어드벤처 등

- 등산로연결 : 용소폭포 출렁다리(보행가교), 전망데크 등

- 온천수개발: 신규온천공(굴착깊이 1,000m, 굴착지름 12in내외)

- 등산로주차장: 고견사입구 주차장 확장정비(철골조·노상 134면)

O 사 업 비 (단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	2016년	2017년	2018년	임기 이후
계	14,300	1,400	700	3,500	5,700	3,000
국 비	6,000	700	350	600	2,850	1,500
도 비	2,800	210	105	1,180	855	450
군 비	5,500	490	245	1,720	1,995	1,050
민 자	_	_	_	_	_	_

□ 연도별 추진실적

구 분	세부 추진 실적
	• 3월 : 치유의 숲 조성사업(토목·건축, 전기, 통신, 소방) 착공
	• 4월 : 자연휴양림 실시설계 및 기타(문화재, 환경)용역 발주
2016	• 5월 : 2017년 지역발전특별회계 예산 신청
	• 10월 : 거창 항노화 자연휴양림 실시설계 중간보고회 개최
	• 11월 : 군수님 현장방문 및 지도·점검

구 분	세부 추진 실적	
2017	 3월: 치유의 숲 조성사업(토목·건축)-2차분 착공 4월: 치유의 숲 산림치유센터 BF예비인증(한국장애인개발원) 5월: 2018년 지역발전특별회계 예산 신청 8월: 자연휴양림 조성계획 승인 10월: 신규온천공 개발 완료 	
	• 10월 : 보행가교형 등산로 연결사업 특허공법 선정 • 10월 : 등산로 주차장 정비사업 실시설계 완료 • 11월 : 온천공검사 및 자연휴양림 건축협의	

□ 양후 추진계왹

- O 치유의 숲
 - 2018. 02. : 치유의 숲(토목·건축) 2차분 준공 및 잔여분 발주
- O 자연휴양림
 - 2017. 12. : 자연휴양림 조성사업 계약심사 (경상남도)
 - 2018. 01. : 자연휴양림 조성사업 발주
- O 등산로연결
 - 2017. 12 : 등산로 연결사업(보행가교형) 전문가 자문
 - 2018. 03. : 등산로 연결사업(보행가교형) 공사 착공
- O 온천수개발
 - 2018. 03. : 온천공검사 완료
 - 2018. 04. : 온천공 신고


□ 문제점 및 대책

- O 치유의숲 산림치유센터는 장애인등편의법 제10조의2에 따라 의 무적으로 BF(장애물 없는 생활환경)인증을 받아야 하는 건축물로, 건축준공시 건축물 주변 대지까지 포함하여 BF인증이 필요함
 - ⇒ BF본인증 대행용역 시행 및 BF예비인증 심의내용 반영으로 BF인증 준비 철저
- O 등산로 연결사업(보행가교형)은 국내최초로 시도하는 "Y"형 보행 가교로써, 일반 보행가교에 비해 구조가 복잡하여 역학적인 안정 성에 충분한 검토를 요함
 - ⇒ 실시설계과정에서 도내 구조역학· 교량 전문가 자문을 통해 내실있는 설계추진

□ 사진자료



거창 항노화 힐링랜드 조감도

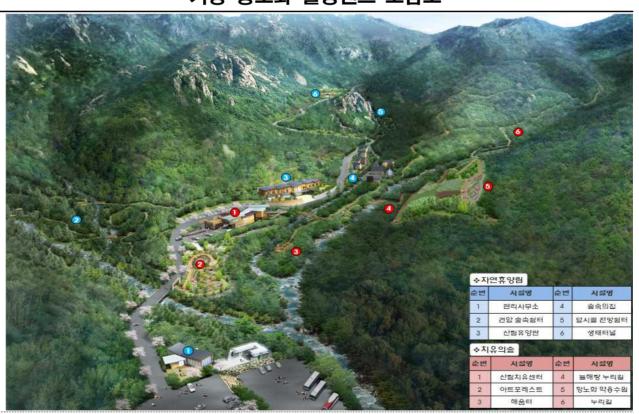

치유의 숲 및 자연휴양림 조감도
