

공약번호	2-6
이행율	100%

추진담당	지역공동체
추진상황	완료(계속)

## 거창전통시장 시설 환경 개선

◇ 거창전통시장 시설현대화로 시장 경제 활성화

### □ 사업개요

- 시장 가로등 설치: 태백상회 ⇔ 서부약국
  - 사업기간: 2016년 6월 ~ 10월
  - 사업량: 7개소(244m)
  - 사업비: 30백만원
- 시장 장옥 비가림 설치
  - 사업기간: 2018년 3월 ~ 12월
  - 사업량: 9개동(2,500m<sup>2</sup>)
  - 사업비: 300백만원(국비180, 군비90, 민자30)
- 아케이드 설치(개폐식): 태백상회 ⇔ 강경젓갈상회
  - 사업기간: 2021년 3월 ~ 12월
  - 사업량: 180m(180m×10m×10m)
  - 사업비: 1,700백만원(국비1,020, 군비510, 민자170)
- 총사업비: 17,522백만원 (단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	2016년	2017년	2018년
계	17,522	17,192	30	-	300
국비	9,126	8,916	30	-	180
도비	500	500	-	-	-
군비	7,695	7,605	-	-	90
민자 등	201	171	-	-	30

### □ 연도별 추진실적

구분	세부 추진 실적
2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시장 가로등 설치 완료: 2016. 9월</li> <li>○ 장옥 비가림시설 설치 사전 컨설팅 완료: 2016. 10월</li> <li>○ 아케이드 설치(개폐식) 사전 컨설팅 완료: 2016. 11월</li> </ul>
2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장옥 비가림시설설치 사업신청: 2017. 2월</li> <li>○ 장옥 비가림시설 사업대상 확정: 2017. 6월</li> </ul>

## □ 양우 추진계획

### ○ 장옥 비가림시설설치 사업 추진

- 사업기간: 2018년 1월 ~ 12월
- 사업량: 9개동(2,500m<sup>2</sup>)
- 사업비: 300백만원(국비180, 군비90, 민자30)

### ○ 태백상회 ⇔ 강경젓갈상회 도로 아케이트 설치(개폐식)설치 사업


- 사전컨설팅 신청: 2019. 10월경
- 시설현대화사업 사업신청: 2020. 2월경

## □ 문제점 및 대책

### ○ 태백상회~강경젓갈 구간 아케이트 설치사업은 시장상인의 80% 이상 동의와 사업비(170백만원) 10%는 시장상인 및 시장 맞은편 상가 소유자들의 자부담분 이므로 시장상인과 맞은편 상가 소유자의 사업추진에 대한 동의서 징구에 애로

### ○ 사업신청자인 (사)시장변영회에서 아케이트 설치사업에 대한 자부담 확보 및 주민의견 수렴 후 추진

## □ 사진자료 (조감도, 사업전경 등)

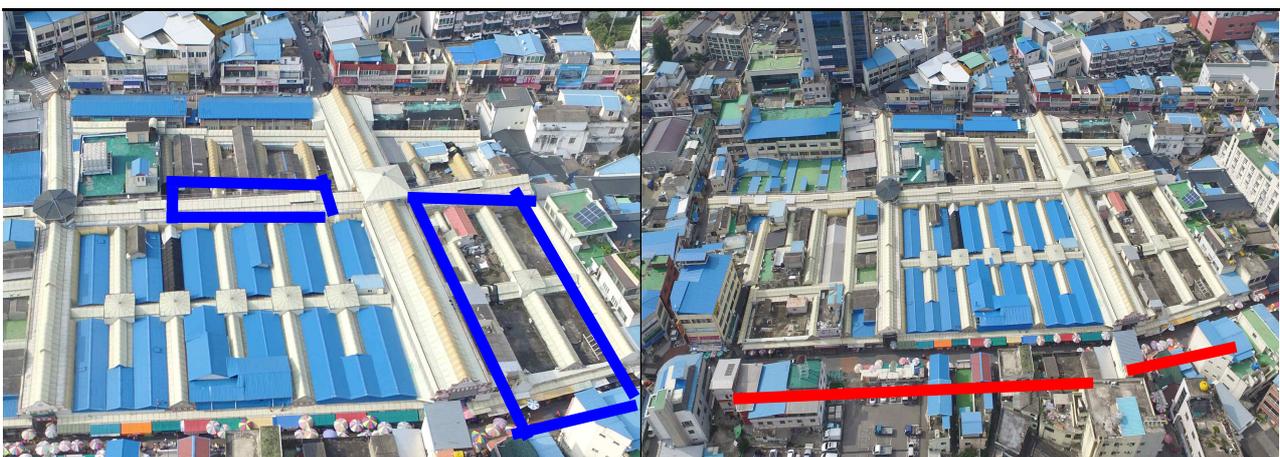

장옥비가림 설치사업

아케이트 설치사업
