

공약번호	2-8
이행율	60%

추진담당	상공담당
추진상황	정상추진

거창전통시장 편의시설 확충

◇ 시장 주차장 복층화를 통한 주차난 해소로 시장경제 활성화

사업개요

- 사업기간: 2017년 ~ 2018년
- 사업량: 자주식 철골조주차장 3층 4단(5,160m²)
- 총사업비: 3,731백만원(국비 2,208백만원, 군비 1,523백만원)
(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년
계	3,731	801			2,930	
국비	2,208	450	-	-	1,758	-
도비	-	-	-	-	-	-
군비	1,523	351	-	-	1,172	-
민자등	-	-	-	-	-	-

연도별 추진실적

구분	세부 추진 실적
2016	○ 시장 주차장 복층화 사전 컨설팅 완료: 2016. 10월
2017	○ 시장 주차장 복층화 선정: 2017. 03월
	○ 주차환경개선 사업 국고보조금 교부: 2017. 9월 ○ 실시설계 용역계약: 2017. 12월

양우 추진계획


- 실시설계 용역 완료: 2018. 4월
- 공사시행: 2018. 6월 ~

문제점 및 대책

○ 사업시행 시 소음, 먼지 등으로 인한 민원 발생

⇒ 민원이 발생되지 않도록 방지시설(차단벽) 설치 및 사전 주민설명회 개최

사진자료 (조감도, 사업전경 등)

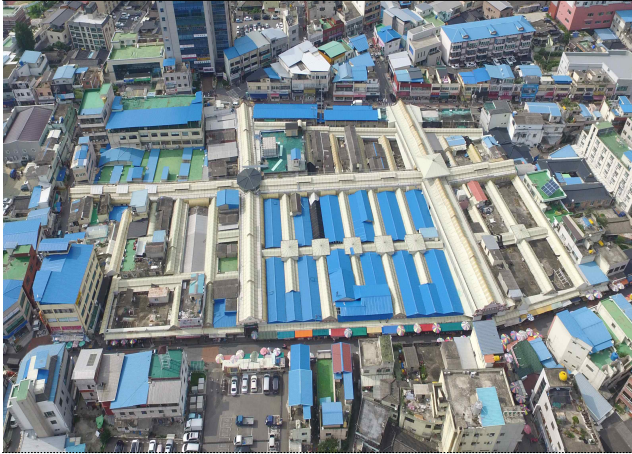

거창시장 전경



거창시장 주차장 전경
